



Projet d'installation Sud

État jusqu'au quatrième trimestre de

2023

2 février 2024

OTTAWA
POLICE

Objectif


Faire le point sur l'état du projet et rendre compte des engagements pris au cours du quatrième trimestre de 2023 dans le cadre du pouvoir délégué.

Examen

- État du projet
- Aperçu financier
- Prochaines étapes



État d'avancement du projet jusqu'en décembre 2023

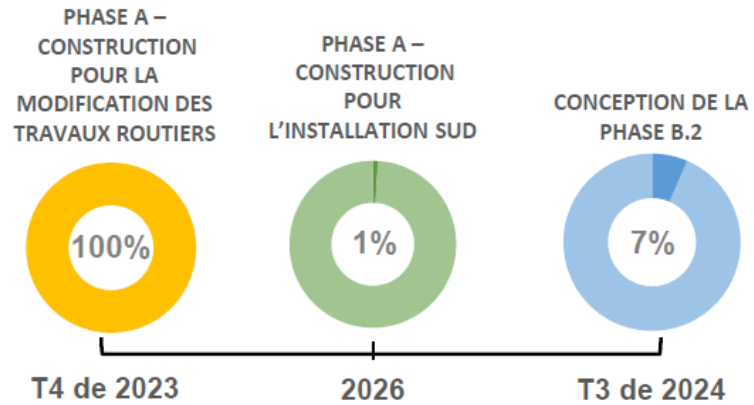

Mesures prises

- Construction pour la modification des travaux routiers
- Construction principale – attribution du contrat
- Mobilisation de la construction
- Recrutement de consultants pour la phase B.2

Activités du projet en cours – premier trimestre de 2024

- Construction principale – logistique du site, défrichage du site, fonçage des pieux
- Activités du programme fonctionnel dans le cadre de la phase B.2
- Planification préalable de l'aménagement des locaux

Aperçu financier

États financiers	Fonds dépensés ou engagés
Budget du projet au quatrième trimestre de 2023	179 046 193 \$
Rajustements budgétaires du projet 2024(*)	14 669 000 \$
Budget total du projet mis à jour pour 2024	193 715 193 \$
Soustraction des fonds dépensés ou engagés (en date du 31 décembre 2023)	136 896 939 \$
Montant disponible	56 818 254 \$

(*) Comprend le coût du terrain, l'évaluation centrale – l'évolution et l'avancement d'Elgin-C dans le cadre de la demande budgétaire de 2024.

(**) Comprend les nouvelles modifications au contrat de Colliers et de Moriyama Teshima et l'achat d'assurances. Les détails complets des bons de commande supplémentaires émis au cours du quatrième trimestre de 2023 seront indiqués dans le rapport de fin d'année 2023.

Le point sur les dépenses du quatrième trimestre de 2023	Fonds dépensés ou engagés
Solde au 30 septembre 2023	132 631 174 \$
Solde au 31 décembre 2023 (**)	136 896 939 \$
Augmentation des fonds dépensés ou engagés au quatrième trimestre de 2023	4 265 765 \$

Mesures relatives au pouvoir délégué

Modifications apportées au contrat

- Modification du contrat de Colliers Project Leaders Inc. pour des services de soutien à la gestion de projet pour la phase B.2.
- Modification du contrat de Moriyama Teshima pour des services d'architecte principal pour la conception de la phase B.2 et les travaux de construction s'y rattachant.

Nouveau contrat

- Assurance construction du SPO

Premier trimestre de 2024

- Préparation du site pour le fonçage des pieux par excavation et nivellement
- Début et fin du fonçage des pieux
- Élaboration, achèvement et approbation du programme fonctionnel de la phase B.2
- Lancement de l'avant-projet de conception de la phase B.2



Activités sur le site





**SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE**

*Un partenaire fiable de la sécurité communautaire
A Trusted Partner in Community Safety*
