



POLICE



Projet d'installation Sud

État – Troisième trimestre de 2024

5 septembre 2024

Programme

Objectif

Faire le point sur l'état du projet et rendre compte des engagements pris au cours du troisième trimestre (T3) de 2024 dans le cadre du pouvoir délégué.


Objectif

- État du projet
- Aperçu financier
- Prochaines étapes



État du projet

État d'avancement du projet jusqu'au T3 de 2024

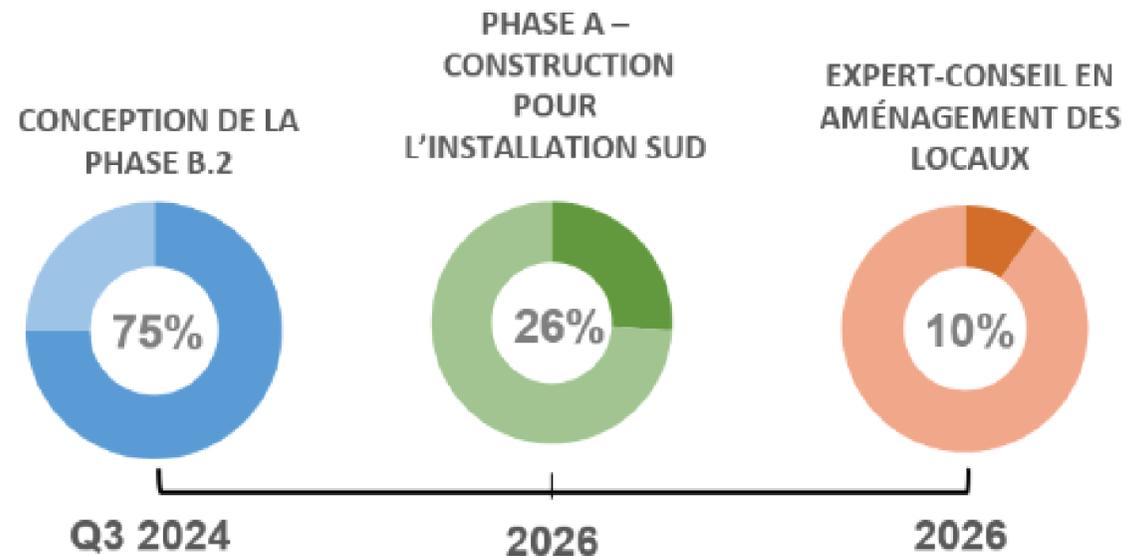

Mesures prises au T3 de 2023

- Activités de construction : fonçage des pieux terminé, fondations pour le garage spécialisé
- Intérieur du dernier étage : 95 % de l'élaboration de la conception est terminé
- Experts-conseils en aménagement des locaux : processus d'appel d'offres terminé

Activités du projet en cours

- Construction principale : semelles sur pieux/fondations, travaux de fondation et de bétonnage au garage spécialisé/édifice Nord et stationnement étagé
- Intérieur du dernier étage : l'élaboration de la conception s'approche des 100 %
- Experts-conseils en aménagement des locaux : processus d'appel d'offres pour le recrutement

Risques surveillés

- Analyse des changements de propriétaire (pour réagir aux évolutions opérationnelles)
- Conditions du sol pour le fonçage des pieux, modification de la séquence des travaux
- Articles à long délai de livraison

État du projet

États financiers	Fonds dépensés ou engagés
Budget du projet au T1 de 2024	193 715 193
Soustraction des fonds dépensés ou engagés (au 31 août 2024)	137 186 272
Montant disponible	56 528 921


Mise à jour sur les dépenses du T3 de 2024	Fonds dépensés ou engagés
Solde au 30 juin 2024	137 179 017
Solde au 31 août 2024	137 186 272
Réduction des fonds dépensés ou engagés au T3 de 2024	7 255

Mesures relatives au pouvoir délégué

Aucun changement – Aucun nouveau contrat ou contrat modifié dans le cadre du pouvoir délégué.

Nouveau contrat (>100 000 \$)

Aucun nouveau contrat de plus de 100 000 \$ n'a été conclu depuis le T1 de 2024

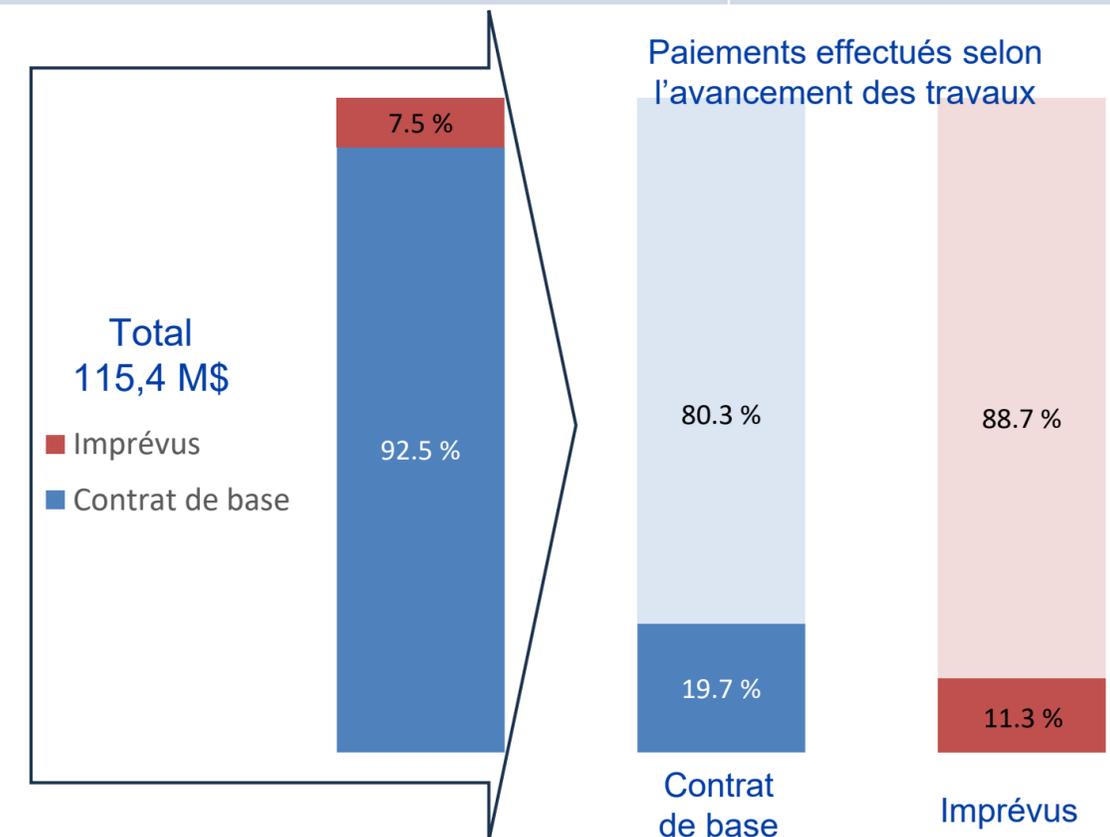


Prochaines étapes

T4 de 2024

- Poursuite des travaux de fondation, murs et dalles de plancher en béton, et montage de charpentes d'acier
- Intérieur du dernier étage : modification de permis, ordre de modification négocié
- Attribution du contrat aux experts-conseils en aménagement des locaux, lancement et activités d'amorce




Activités sur le site

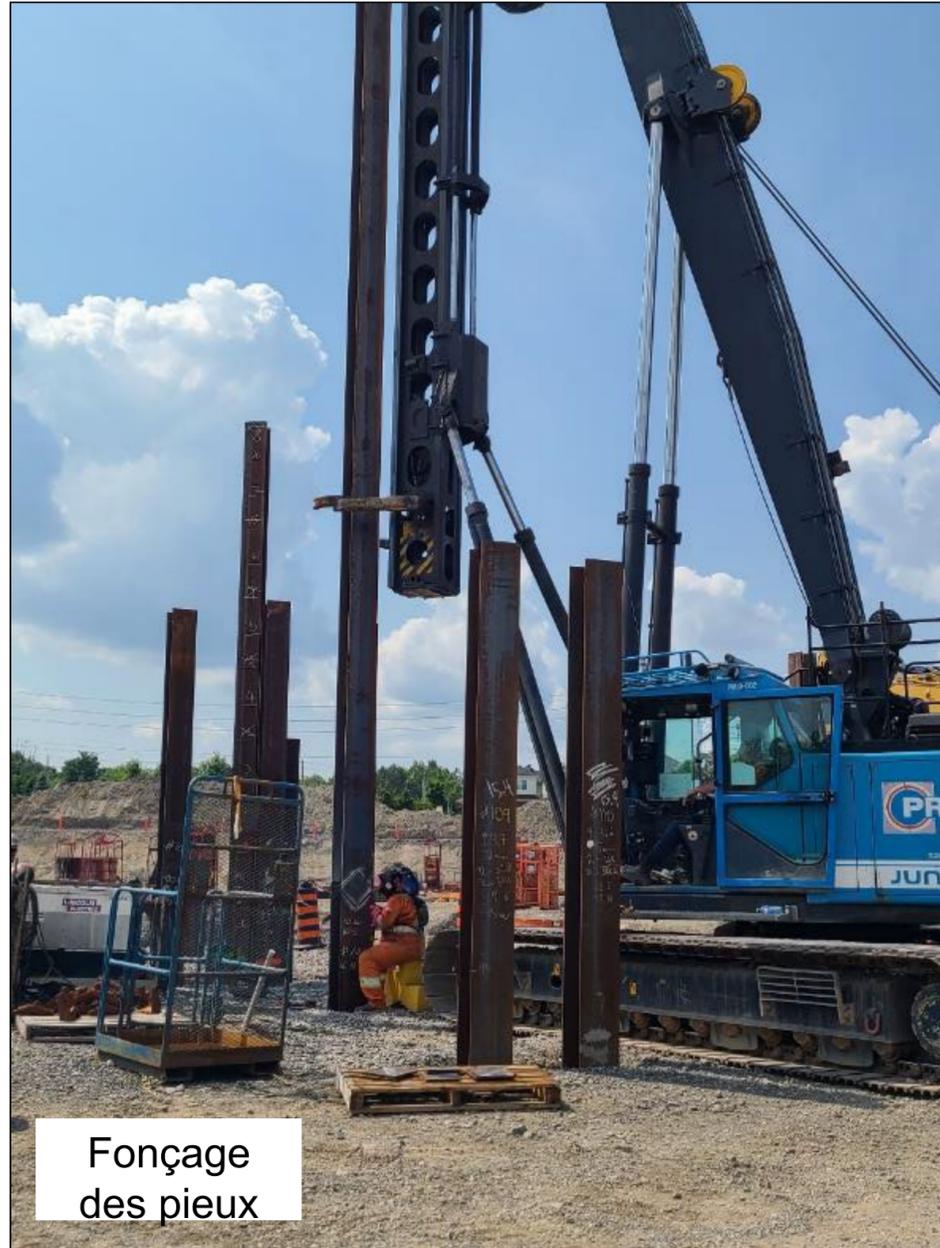

Fonçage des pieux



Stationnement étagé et garage spécialisé

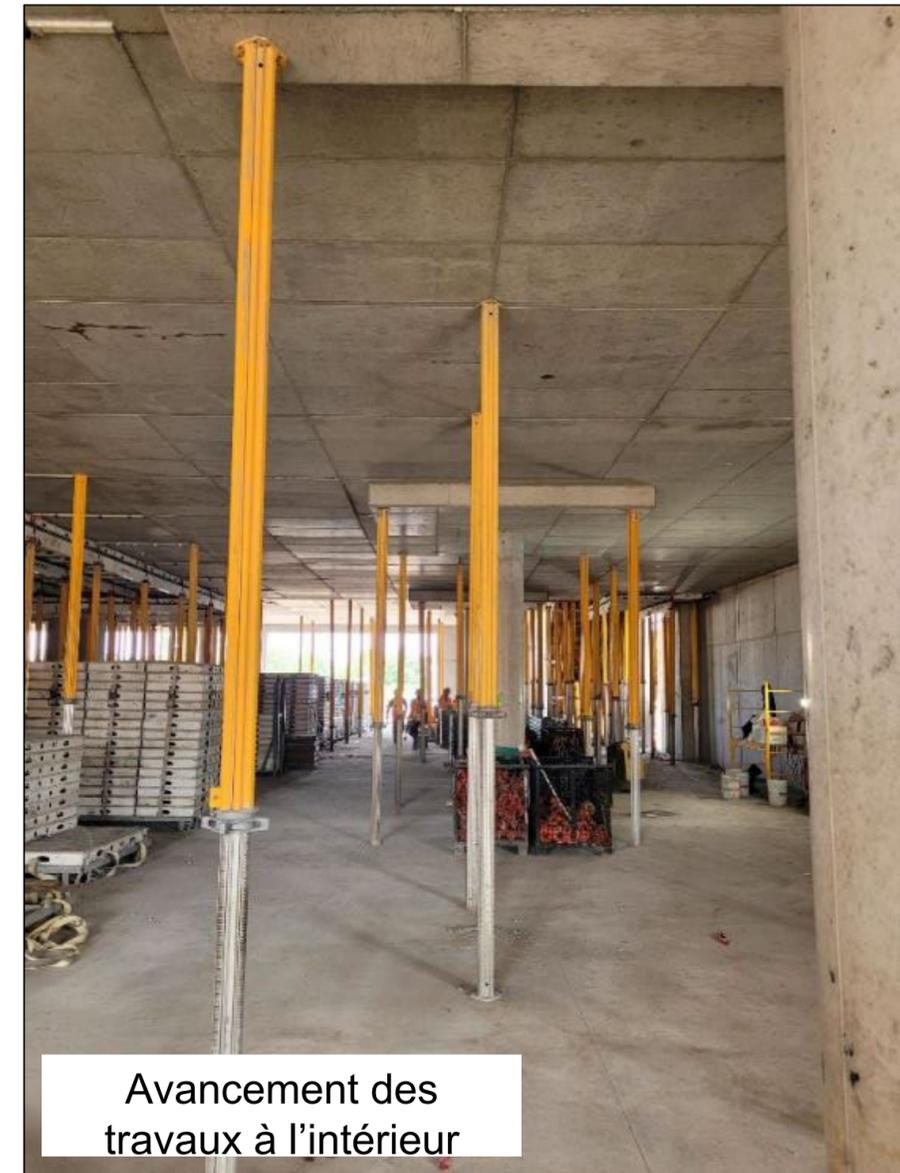

Avancement des travaux à l'intérieur



SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE

Un partenaire fiable de la sécurité communautaire
A Trusted Partner in Community Safety
