



Projet d'installation Sud

État jusqu'au premier trimestre de 2024

9 avril 2024

The logo for the Ottawa Police, featuring the word "OTTAWA" in a small, blue, sans-serif font above the word "POLICE" in a larger, bold, blue, sans-serif font. The "O" in "POLICE" is stylized with a circular graphic element.

OTTAWA
POLICE

Objectif


Faire le point sur l'état du projet et rendre compte des engagements pris au cours du premier trimestre de 2024 dans le cadre du pouvoir délégué.

Examen

- État du projet
- Aperçu financier
- Prochaines étapes



État d'avancement du projet jusqu'en mars 2024

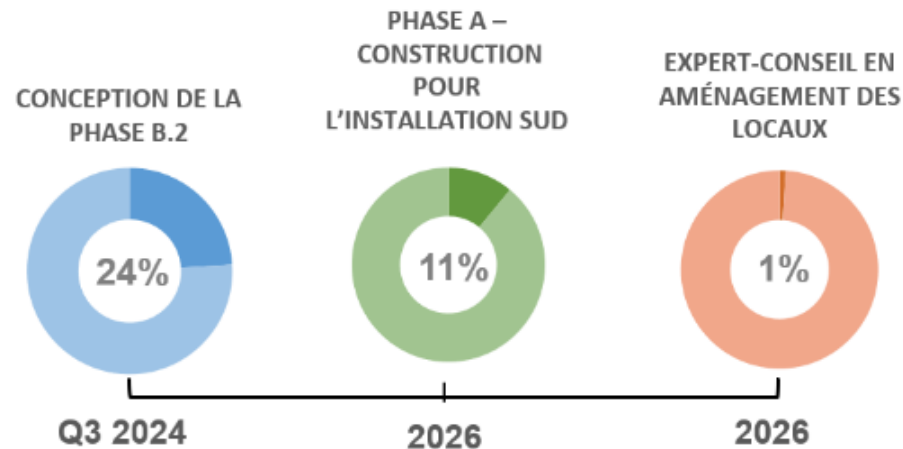

Mesures prises au premier trimestre de 2024

- Activités de construction : excavation, entretien du site, installation de pieux, préparation des fondations
- Approbation de la phase B.2 du programme fonctionnel
- Activités de planification préalable de l'aménagement des locaux



Activités du projet en cours

- Construction principale – finition des pieux, fondations, installation de la grue
- Approbation de l'avant-projet de conception de la phase B.2 et début de l'élaboration de la conception
- Recrutement d'un expert-conseil en aménagement des locaux

États financiers	Fonds dépensés ou engagés
Budget du projet au premier trimestre de 2024	193 715 193
Soustraction des fonds dépensés ou engagés (en date du 31 décembre 2023)	137 323 245
Montant disponible	56 391 948

Le point sur les dépenses du premier trimestre de 2024	Fonds dépensés ou engagés
Solde au 31 décembre 2023	136 896 939
Solde au 31 mars 2024	137 323 245
Augmentation des fonds dépensés ou engagés au quatrième trimestre de 2023	426 306

Mesures relatives au pouvoir délégué

- Aucun nouveau contrat ou contrat modifié n'a été conclu au cours du premier trimestre de 2024 dans le cadre du pouvoir délégué au chef.

Nouveau contrat (>100 000 \$)

- Services d'essais et d'inspections par des tiers de Cleland Jardine et de Paterson Group

Deuxième trimestre de 2024 :

- Finition des pieux, installation de grue, début des travaux d'excavation
- Approbation de l'avant-projet de conception de la phase B.2
- Soumissions pour l'élaboration de la conception de la phase B.2 – 33 % et 66 %
- Activités de recrutement d'un expert-conseil en aménagement des locaux



Activités sur le site



Routes du site



Pieux



**SERVICE DE POLICE D'OTTAWA
OTTAWA POLICE SERVICE**

*Un partenaire fiable de la sécurité communautaire
A Trusted Partner in Community Safety*
